

Расчет экономической эффективности и идентификация основных рисков проекта

1. Экономическая эффективность проекта и стоимостной план

Стоимостной план

Статьи затрат	1 период	2 период	3 период	4 период	5 период	6 период
Разработка сайта	150000	150000	100000	0	0	0
Дизайн (макеты)	50000	0	0	0	0	0
Хостинг, SSL, домен	0	0	20000	0	0	0
Интеграция с 1С	0	40000	40000	0	0	0
Итого (Прочие капиталовложения)	200000	190000	160000	0	0	0
Маркетинговые издержки (реклама Яндекс Директ)	0	0	30000	100000	150000	150000
Заработная плата	150000	150000	150000	150000	150000	150000
Эквайринг (2% от выручки)	0	0	0	6000	14000	24000

Прогнозный бюджет движения денежных средств

	1 период	2 период	3 период	4 период	5 период	6 период
Поступления от продаж	0	0	0	300000	700000	1200000
Затраты на материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Постоянные издержки	0	0	30000	106000	164000	174000
Зарплата и социальные взносы	150000	150000	150000	150000	150000	150000
Налоги	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от операционной деятельности	-150000	-150000	-180000	44000	386000	876000
Приобретение основных средств	0	0	0	0	0	0

Строительство	0	0	0	0	0	0
Прочие капиталовложения	-200000	-190000	-160000	0	0	0
Денежный от инвестиционной деятельности	-200000	-190000	-160000	0	0	0
Акционерный капитал	0	0	0	0	0	0
Поступления заемных средств	0	0	0	0	0	0
Возврат займов	0	0	0	0	0	0
Расходы по процентам	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток	-350000	-340000	-340000	44000	386000	876000
Денежные средства на начало периода		-350000	-690000	-1030000	-986000	-600000
Денежные средства на конец периода	-350000	-690000	-1030000	-986000	-600000	276000

Показатели:

Ставка дисконтирования	25% (в соответствии с условиями задачи)
NPV	183402 руб.
IRR	74%
Индекс прибыльности (PI)	1,18
Обычный срок окупаемости	5,7
Дисконтированный срок окупаемости	5,8

Расчет индекса прибыльности, обычного и дисконтированного срока окупаемости представлен в excel файле на листе «мои расчеты». Анализ чувствительности представлен в том же файле на листе «SENS».

2. Идентификация основных рисков проекта

В соответствии с задачей

Риск	Вероятность (1-5)	Влияние на бюджет (1-5)	Зона риска	Комментарий
Задержка разработки на 1 месяц	4	4	Красная	Срыв срока из-за болезни разработчика
Рост стоимости контекстной рекламы на 30%	3	3	Желтая	Сезонность, конкуренты
Проблемы с интеграцией 1С (потребуется +80 т.р.)	3	2	Желтая	Сложный API
Отказ платежного шлюза при высоких нагрузках	2	4	Желтая	Риск потери выручки
Низкая конверсия (0.5% вместо 2%)	4	5	Красная	Плохой UX/UI

Для удобства переведем показатели вероятности и влияния из пятибалльной шкалы в проценты:

5 баллов – 100%,

4 балла – 80%,

3 балла – 60%

2 балла – 40%

1 балл – 20%

0 баллов – 0%.

Проранжируем риски:

№	Название риска	Вероятность Наступления, %	Оценка Последствий, %	Количественный ранг риска	Ранг
		А	Б	=А*Б	
1	Низкая конверсия (0.5% вместо 2%)	80	100	0,8	Значительный
2	Задержка разработки на 1 месяц	80	80	0,64	Значительный
3	Рост стоимости контекстной рекламы на 30%	60	60	0,36	Умеренный
4	Отказ платежного шлюза при высоких нагрузках	40	80	0,32	Умеренный
5	Проблемы с интеграцией 1С (потребуется +80 т.р.)	60	40	0,24	Незначительный

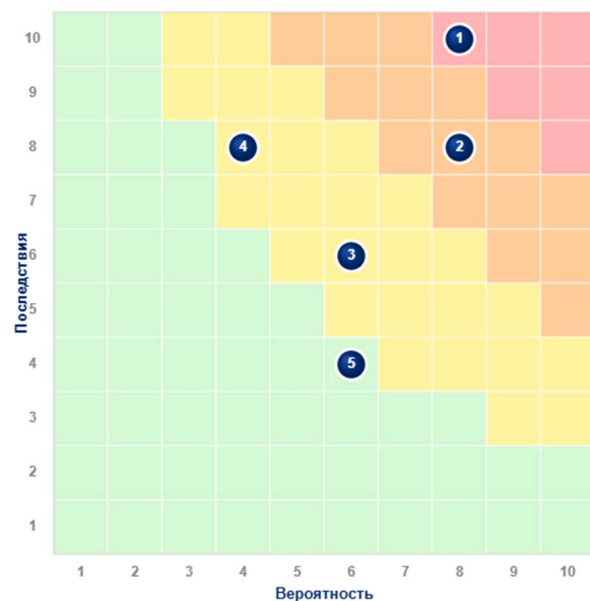


Таблица 2. Риски, их возможные последствия и потенциальные действия по реагированию.

№	Риск	Возможные последствия	Потенциальные действия по реагированию	
			Превентивные	Реагирующие
1	Низкая конверсия (0.5% вместо 2%)	Вследствие недостаточной эффективности UX/UI дизайна и несоответствия сайта ожиданиям пользователей может наступить снижение конверсии с плановых 2% до 0,5%, что может привести к снижению объема продаж и ухудшению экономической эффективности проекта.	Тестирование UX/UI до запуска; анализ воронки продаж; выявление проблемных этапов оформления заказа; А/В-тестирование элементов сайта	Корректировка UX/UI; перераспределение рекламного бюджета в пользу эффективных каналов; проведение дополнительных рекламных и маркетинговых мероприятий
2	Задержка разработки на 1 месяц	Вследствие болезни разработчика или возникновения технических проблем может наступить задержка разработки сайта на один месяц, что может привести к переносу запуска проекта и отсрочке получения плановой выручки.	Планирование временного резерва; контроль выполнения этапов; регулярная проверка промежуточных результатов; определение резервного разработчика	Перераспределение задач; привлечение резервного специалиста; корректировка календарного плана
3	Рост стоимости контекстной рекламы на 30%	Из-за сезонного роста стоимости рекламного трафика и усиления конкуренции может наступить увеличение стоимости контекстной рекламы на 30%, что может привести к увеличению текущих расходов и снижению NPV проекта.	Мониторинг стоимости рекламного трафика; контроль эффективности рекламных кампаний; установление лимита рекламных расходов	Перераспределение рекламного бюджета в пользу наиболее эффективных каналов; сокращение неэффективных рекламных кампаний
4	Отказ платежного шлюза при высоких нагрузках	Вследствие недостаточной производительности или технического сбоя платежного	Нагрузочное и функциональное тестирование; подготовка резервного способа оплаты,	Оперативное восстановление работоспособности;

		шлюза может наступить отказ в проведении платежей при высокой нагрузке, что может привести к потере части заказов и снижению выручки проекта.	мониторинг доступности платежей	переключение на резервный способ оплаты; информирование пользователей о доступных способах оплаты
5	Проблемы с интеграцией 1С (потребуется +80 т.р.)	Вследствие технической сложности интеграции и особенностей API может наступить необходимость выполнения дополнительных работ по интеграции с 1С, что может привести к увеличению капитальных затрат проекта на 80 тыс. руб.	Предварительное техническое обследование; проверка API и совместимости систем; поэтапное тестирование обмена данными; резервирование 80 тыс. руб.	Привлечение IT-специалиста/подрядчика; устранение выявленных ошибок; использование предусмотренного финансового резерва
